

Bancada de pia sanitária - Obra IFET Juiz de Fora - Contrato 53/2022

2 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

27 de outubro de 2022 07:19

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezada Catarina,


Poderia nos informar qual procedimento que deverá ser adotado com relação divergência entre projeto e a planilha orçamentaria.

As bancadas de pias dos sanitário masc. e fem. no projeto indica louça sobre posta e na planilha menciona cuba oval de louça 50x30

1- A Largura da banca das pias no projeto consta **0,40cm** se for trocar por cuba oval a largura deverá ser no mínimo **0,60cm**

2- O metalon de sustentação indicado na planilha é **20x30mm** no projeto o metalon é **40x50mm, padrão utilizado 30x50mm na chapa 16.**

3- O Acabamento de Testeira e Rodamão normalmente a espessura é de 2cm, reduz o peso da bancada, pode ser com esta espessura?.

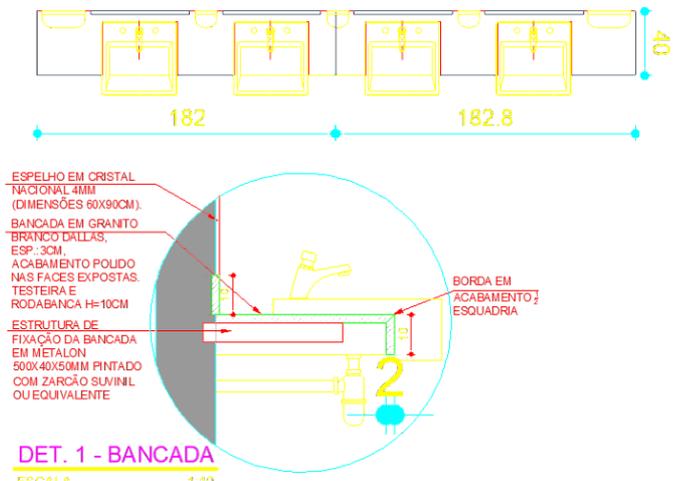

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM (B1, B2 E B4)	m²	51,50
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA (B3)	m²	14,62

No aguardo,

Sds,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezado Jaime,

Após analisar as divergências apontadas, seguem definições:

Realmente o desenho do projeto indica cuba de sobrepor, porém, há uma nota no projeto indicando que as cubas serão de embutir:

NOTA:

- 1) AS CUBAS DOS I.S. MASC. E I.S. FEM. DESENHADAS COMO TIPO SEMI ENCAIXE DEVERÃO SER EXECUTADAS COMO CUBAS DE EMBUTIR, CONFORME ORÇAMENTO E MEMORIAL.

Assim:

1 - A Largura da banca das pias no projeto consta **0,40cm** se for trocar por cuba oval a largura deverá ser no mínimo **0,60cm**

R.: As cubas deverão ser de embutir, assim, as bancadas deverão comportar este tipo de cuba. Considerando as especificações de 50 x 30, acredito que uma bancada de 50cm de largura seria adequada.

2- O metalon de sustentação indicado na planilha é **20x30mm** no projeto o metalon é **40x50mm, padrão utilizado 30x50mm na chapa 16.**

R.: Utilizar a especificação de projeto.

3- O Acabamento de Testeira e Rodamão normalmente a espessura é de 2cm, reduz o peso da bancada, pode ser com esta espessura?.

R.: Considerando que não gera prejuízo estético e de acabamento, não tem problema que a espessura das testeiras e rodamão seja 2 cm.

Ressalto que esta obra possui regime de execução por preço global e, a princípio, estas adequações não demandarão qualquer alteração contratual, conforme dispõe a seção 15 do Anexo I - Projeto Básico.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450
