

CONTRATO 053/2022 - HALL / CIRCULAÇÃO

6 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>


24 de março de 2023 às 20:49

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Mauricio <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezada Catarina,

Informamos que encontramos uma diferença na medida da área de circulação da escada no hall de entrada. A medida do projeto entre o degrau e a parede é 1,50m e a medida encontrada foi 1,30m, uma diferença de 0,20m. Aconteceu alguma coisa na montagem da forma dos degraus.

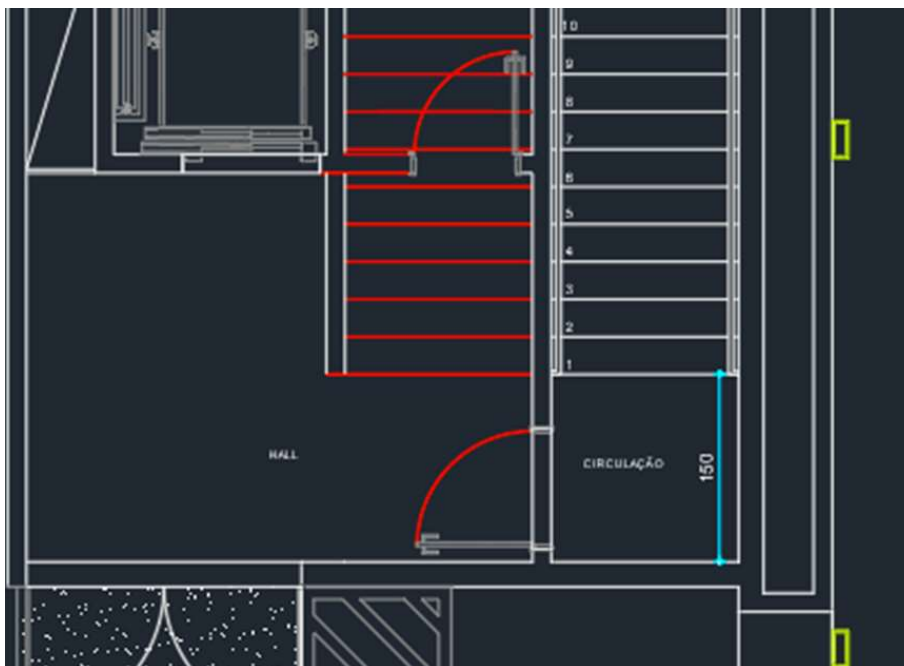



No aguardo,

Sds,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

26 de março de 2023 às 23:19

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime,

Realizarei uma visita à obra em breve para verificar a situação e verificar a melhor solução. Questiono se o mesmo problema ocorreu nos pavimentos superiores ou apenas no térreo?

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

27 de março de 2023 às 09:23

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Catarina,

demais andares está ok.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

29 de março de 2023 às 09:32

Para: jaime.mtrindade@gmail.com, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime,

Consultando a IT 08 do CBMMG e a NBR 9077 que tratam de saídas de emergência, não vislumbrei nenhum impedimento quanto a execução do hall com a distância de 1,30m.

Assim, peço apenas que o responsável técnico pela execução da obra também faça uma verificação para evitar problemas futuros de emissão do AVCB da edificação posteriormente.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

30 de março de 2023 às 21:21

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: jaime.mtrindade@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezados, boa noite!

As medidas existentes do hall no bloco Q, atende a IT 08 do CBMMG e a NBR 9077 onde foi conferidas, não encontrando nenhum obstáculo que não atenda as normas vigentes.

Att..

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Claudio Reis

Arquiteto e Urbanista

+55 32 98816-0498

claudioreis.mtrindade@gmail.com

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

31 de março de 2023 às 09:12

Para: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Cc: jaime.mtrindade@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezados,

Considerando a manifestação do Cláudio, basta registrar a existência do novo degrau e a nova distância de 1,30m do hall do térreo no projeto as built, não demandando nenhuma alteração da obra.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
